



Informe sobre el  
avance en las obras de  
**Reconstrucción  
del Patrimonio  
Cultural**  
de los Pueblos  
Originarios de la  
Ciudad de México

**Septiembre, 2022**

# Recurso ejercido

<b>Recursos aprobados</b> .....	<b>133,090,789.66</b>
<b>Recursos comprometidos</b> .....	<b>133,090,778.40</b>
<b>Recursos ejercidos</b> .....	<b>124,694,709.61</b>
<b>Obras concluidas</b> .....	<b>18</b>
1. Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras	
2. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.	
3. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.	
4. Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Xochimilco	
5. Templo de San Matías, Barrio de la Asunción, Iztacalco	
6. Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.	
7. San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco, Tlalpan	
8. Templo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco	
9. Capilla del Peñón de los Baños, Venustiano Carranza.	
10. Rectoría de la Inmaculada Concepción, Magdalena Atlític, La Magdalena Contreras	
11. Templo de Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco, Xochimilco	
12. Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa.	
13. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta	
14. Templo de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc	
15. San Bernardino de Siena, Xochimilco.	
16. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco	
17. Conjunto de San Juan de los Lagos, Santiago Tulyehualco, Xochimilco	
18. Templo de San Antonio, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta	
<b>Obras en proceso</b> .....	<b>3</b>
1. Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco	
2. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta	
3. Parroquia de San Fernando Rey, Cuauhtémoc	



**Recurso comprometido**  
**133,090,778.40**

**Recurso ejercido**  
**124,694,709.61**

# Seguimiento de obras

## Alcaldía Xochimilco



Xochimilco. Cabecera  
Templo de San Bernardino de Siena .....100%  
Conclusión: 12 de junio de 2021

Santa Cruz Acalpixca  
Templo de la Santa Cruz .....100%  
Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa  
Templo de Santa María Nativitas .....100%  
Conclusión: 02 de octubre de 2020

Santiago Tulyehualco  
Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco .....100%  
Conclusión contrato: 28 de agosto de 2020  
Conclusión convenio: 4 de diciembre de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos .....100%  
Conclusión: 31 de octubre de 2021

San Luis Tlaxialtemalco  
Templo de San Luis Obispo de Tolosa..... 100%  
Conclusión: 08 de octubre de 2021

San Gregorio Atlapulco  
Templo de San Gregorio Magno ..... 100%  
Conclusión:

# Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco Alcaldía Xochimilco



Inicio de obra:  
24 de agosto de 2020



## • Reconstrucción de torre campanario

- Izaje de campanas hasta la altura indicada en el proyecto.
- Campana de volteo colocada en su lugar definitivo.

## Templo y Antiguo Convento de la Asunción de María, Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta



Inicio de obra:  
27 de enero de 2020



- **Reconstrucción de Muros Perimetrales**  
Suministro y colocación de escalones de piedra, Aplanado Pulido

## Alcaldía Milpa Alta



Santa Ana Tlacotenco  
Templo de Santa Ana Tlacotenco .....100%  
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

San Pablo Oztotepec  
Templo de San Pablo Apóstol ..... 100 %  
Conclusión: 18 de abril de 2021  
\*Tiene una etapa subsecuente de trabajos con SEDATU.

San Antonio Tecómitl  
Templo de San Antonio de Padua ..... 100 %  
Conclusión: 19 de noviembre de 2021

Villa Milpa Alta  
Templo y antiguo convento de la Asunción de Maria...73%  
Conclusión:  
\*Solicita reprogramación de fecha de Término de los trabajos

## Alcaldía Tlalpan



San Miguel Topilejo.  
Templo de San Miguel Arcángel .....100%  
Conclusión: 22 de septiembre de 2020

Santo Tomás Ajusco  
Templo de Santo Tomás Apóstol .....100%  
Conclusión 12 de septiembre de 2020

San Miguel Ajusco  
Templo de San Miguel Arcángel .....100%  
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

## Alcaldía Magdalena Contreras



San Bernabé Ocoatepec  
Parroquia de San Bernabé Ocoatepec .....100%  
Conclusión: 24 de junio de 2020

Magdalena Atlitic  
Rectoría de la Inmaculada Concepción .....100%  
Conclusión: 18 de diciembre de 2020

## Alcaldía Cuajimalpa



San Lorenzo Acopilco  
Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir.....100%  
Conclusión: 31 de marzo de 2021  
\*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

## Alcaldía Iztacalco



Barrio de la Asunción, Iztacalco  
Templo de San Matías Iztacalco ..... 100 %  
Conclusión: 27 de noviembre de 2020  
\*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

# Seguimiento de obras

## Alcaldía Venustiano Carranza



Peñón de los Baños

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe ..... 100 %

Conclusión: 25 de diciembre de 2020

\*Se ejerció una segunda etapa con recurso de SEDATU ya terminada.

## Alcaldía Cuauhtémoc



Tlatelolco

Templo de Santiago Tlatelolco ..... 100 %

Conclusión: 30 de abril de 2021


Guerrero

Parroquia de San Fernando Rey ..... 90 %

Conclusión:

31 de agosto de 2022

# Parroquia de San Fernando Rey, Alcaldía Cuauhtémoc

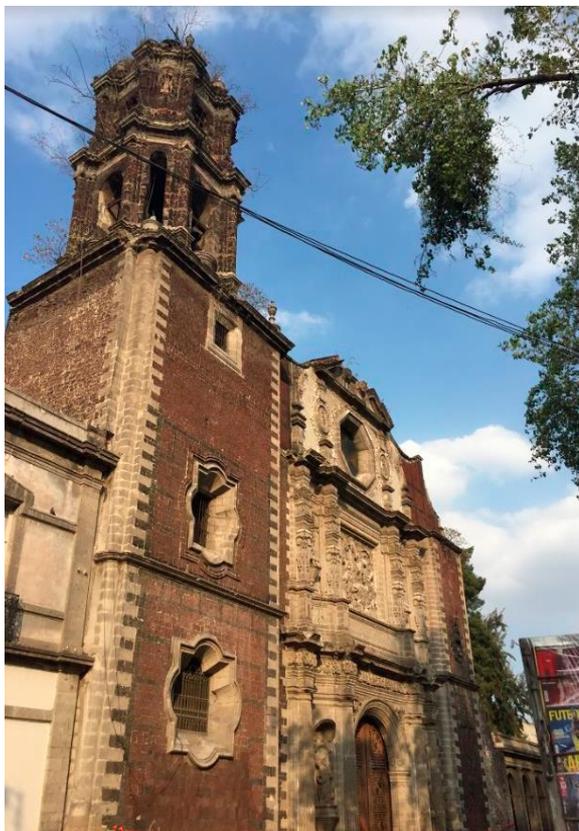


Inicio de obra:  
16 de marzo de 2021

Conclusión de obra:  
31 de agosto de 2022



- Trabajos de retiro de escombre para su disposición final autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y limpieza en general.

# Avance físico financiero al mes de septiembre de 2022

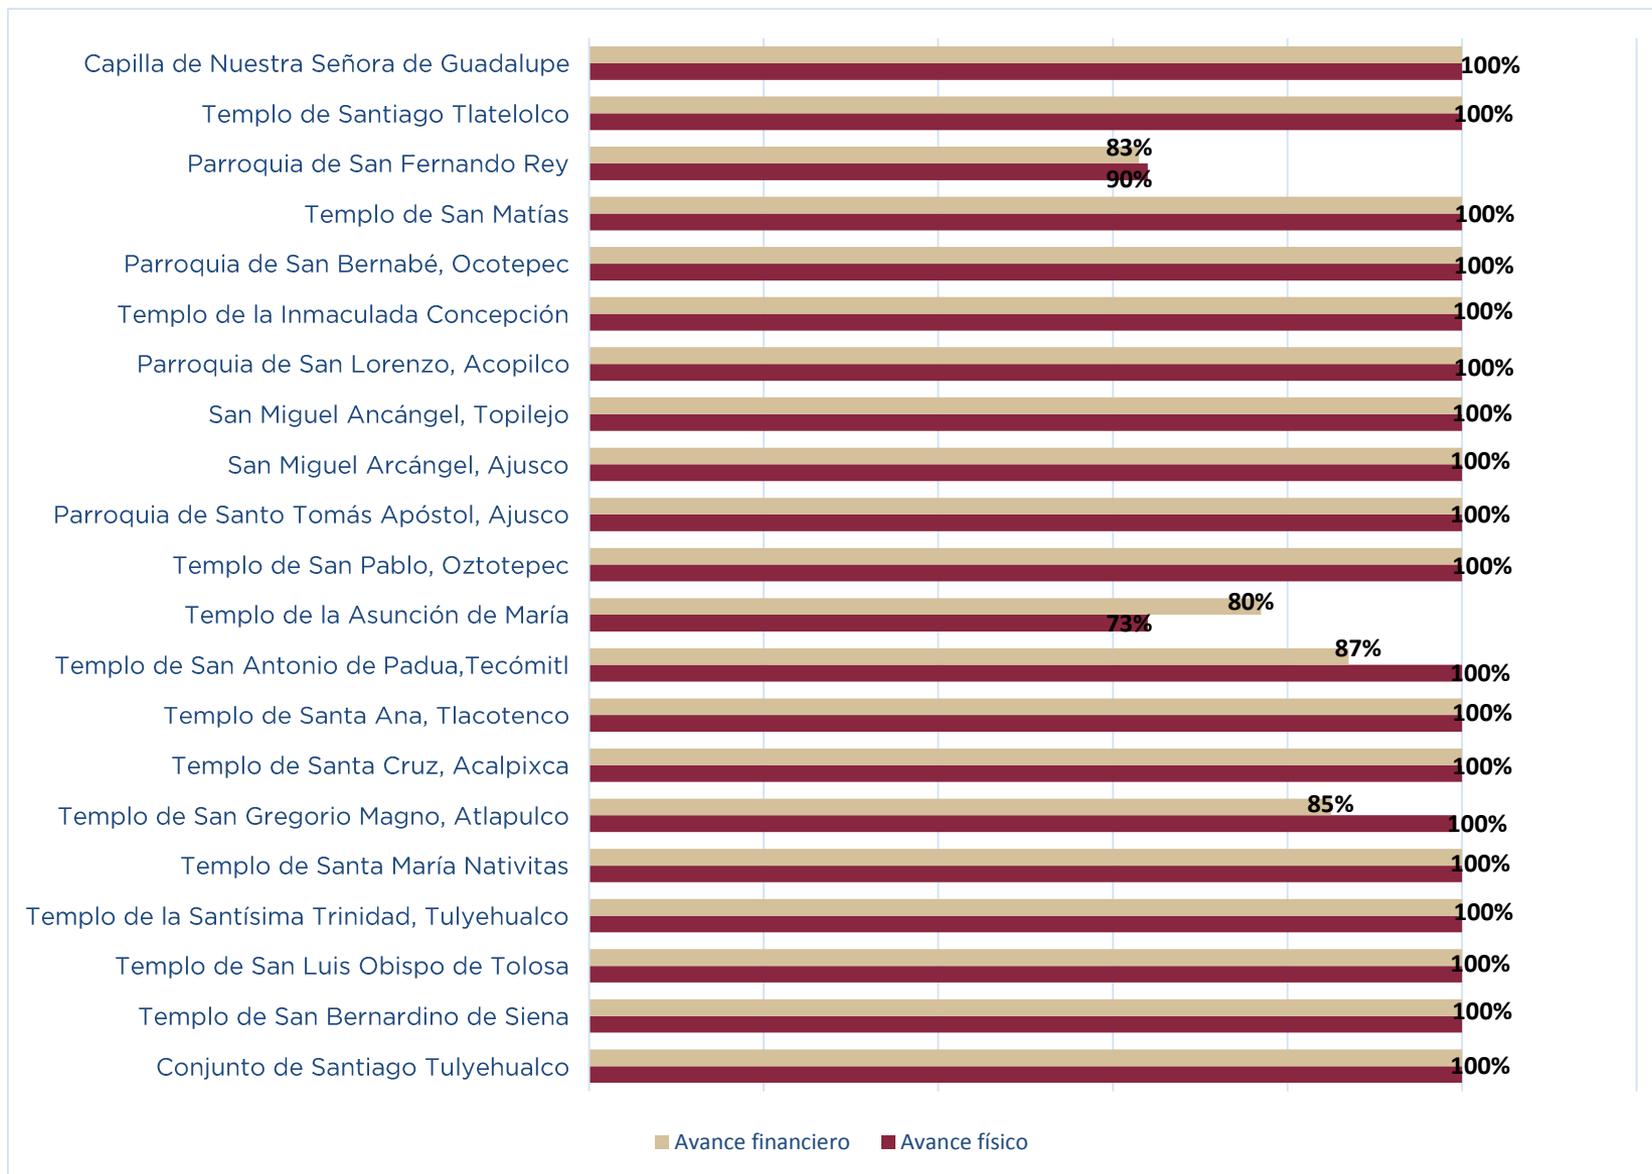



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA  
DE CULTURA

COMISIÓN PARA  
LA RECONSTRUCCIÓN
